

平成 28 年 4 月 18 日
 23 時 30 分現在
 西日本高速道路株式会社

4 月 14 日及び 16 日 九州地方地震による通行止め・災害状況等について (第 11 報)

4 月 14 日(木)21 時 26 分頃及び 4 月 16 日(土) 1 時 25 分頃に発生しました地震による九州支社管内の高速道路の通行止め・災害状況等について、NEXCO 西日本九州支社(福岡県福岡市、支社長:北田正彦)より、次のとおりお知らせいたします。

通行止めによりお客さまには大変ご迷惑をおかけしております。

1. 通行止め解除区間

下記の区間の通行止めを解除しました。

	道 路 名	上下線	区間	通行止め日時
①	大分自動車道	上下線	玖珠 IC ～ 湯布院 IC	4 月 16 日 1 時 26 分 ～ 4 月 18 日 23 時 15 分

2. 通行止めの状況

現在、九州支社管内道路の下記区間が通行止めとなっています。

	道 路 名	上下線	区間	通行止め日時
①	九州自動車道	上下線	益城熊本空港 IC～松橋 IC	4 月 14 日 21 時 27 分～
②	九州中央自動車道	上下線	嘉島 JCT ～ 益城 TB	
③	九州自動車道	上下線	植木 IC ～ 益城熊本空港 IC	4 月 16 日 1 時 26 分～
④	九州自動車道	上下線	松橋 IC ～ 八代 IC	
⑤	大分自動車道	上下線	湯布院 IC ～ 別府 IC	
⑥	大分自動車道	上下線	速見 IC ～ 日出 JCT	

3. 道路の被害状況

九州管内の一部区間で通行止めを継続しています。これまでに確認できた主な被害状況は以下のとおりです。

	道路名	区分	区間	被害状況
①	九州自動車道	上下線	益城熊本空港 IC ～ 御船 IC	土工部盛土法面の崩落 1 か所 L=30m 土工部路面陥没、段差、ひび割れ、隆起等 多数 橋梁部ジョイントの段差 4 橋 (最大段差 20cm、開き 50cm) 橋梁下部工の角かけ
②	九州自動車道	上下線	御船IC～松橋IC	土工部路面陥没、段差、ひび割れ、隆起等 多数 跨道橋(府領第一橋)の落橋 跨道橋(一ツ橋跨道橋)の損傷・桁ずれ
③	九州自動車道	上下線	熊本IC	跨道橋(神園橋) の橋脚損傷
④	九州自動車道	ランプ		ランプ橋(東原橋) の橋台損傷
⑤	大分自動車道	上下線	湯布院IC～日出 JCT	のり面の土砂崩落

■九州自動車道（益城熊本空港 IC～御船 IC）

177.8kp 付近 土工部盛土法面・路面の被害状況

作業状況(18 日 12 時時点)



■九州自動車道 緑川 PA(御船 IC～松橋 IC)


跨道橋(県道 32 号小川嘉島線 府領第一橋)の被害状況

作業状況(18 日 18 時時点)



■九州自動車道 熊本 IC

跨道橋(市道石原町長峰第1号 神園橋)の被害状況

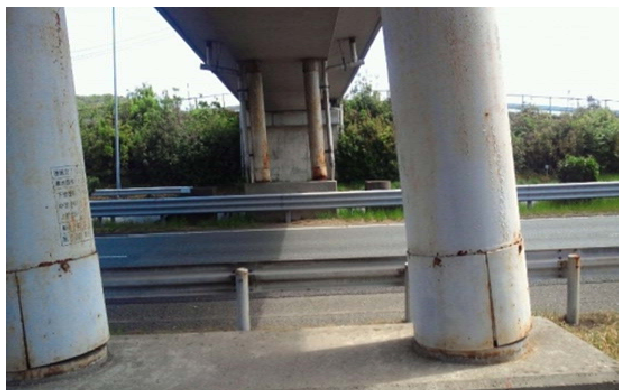

作業状況(18日19時時点)



■九州自動車道 (益城熊本空港 IC～嘉島 JCT)

179.6kp 付近 木山川橋の被害状況



作業状況(18日18時時点)



■大分自動車道(湯布院 IC～日出 JCT)

のり面土砂崩落現場の作業状況(18日18時時点)



4.第三者被害について

現時点において、高速道路上をご利用中のお客さま及び休憩施設内のお客さま、従業員等に対する被害等は確認されていません。

5.通行止めの解除見込み

今後の点検状況および災害発生箇所における復旧作業の進捗状況を確認した上で適宜通行止めを解除する予定です。
